


项目描述

ecom




SimulTrain

项目描述

项目名称	e-com
计周期	1周
里程碑	1. 规格已确定 2. 软件原型已准备好 3. 测试已完成 4. 部署已完成
团队	-Sue, Fre and Time -若有所需的其他成员
描述	根据今年初制定的市场营销战略,管理层希望我们能为客户们提供一个在线互动服务系统。这将让客户们能够直接下和跟进订单而不必牵涉到客服或会计部门。一个初步的进度表列明必须完成的任务,预算和时间期限已经草拟好了。核心团队也已成立了。


组织结构图

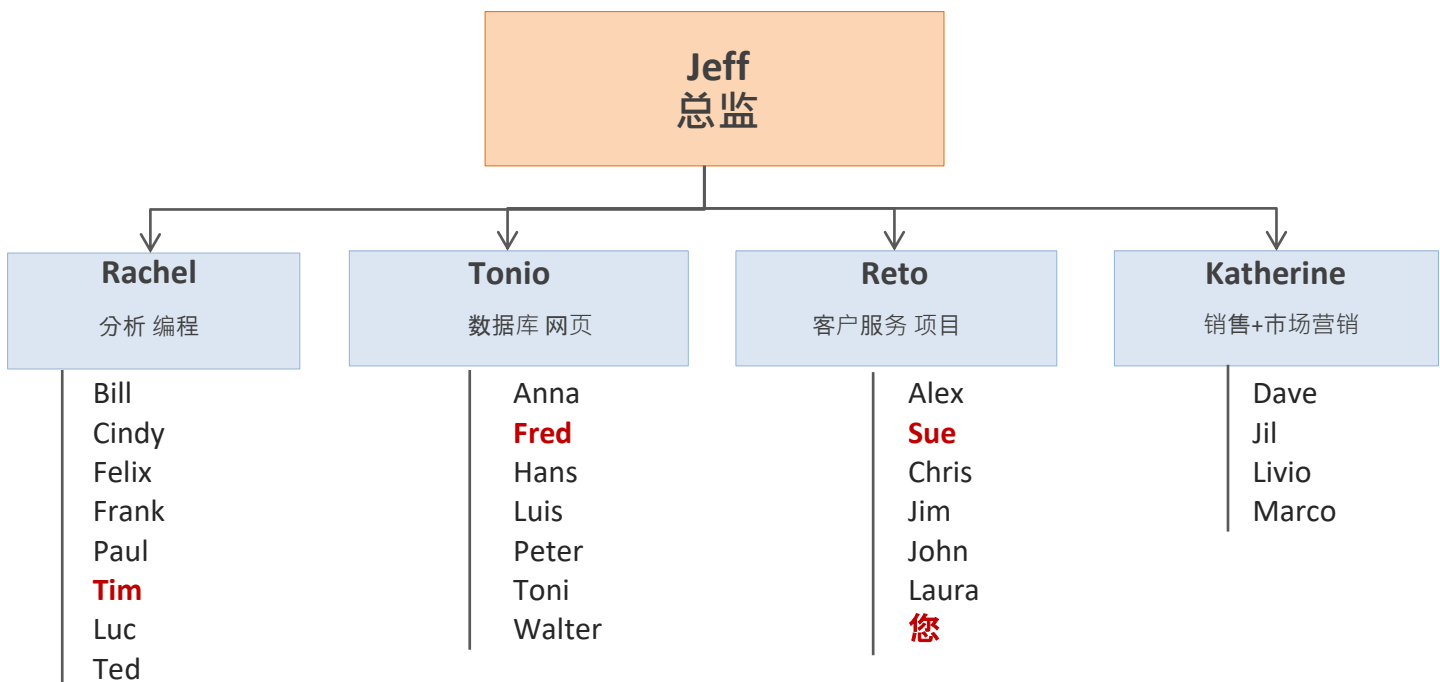

	项目任务	员工人数	预计所需时间 (日)	基于之前的任 务/工作/活动	技能要求				
					网页设计	数据库	编程	业务	销售+市场营销
1	规格/要求	2	5	—	2			5	3
2	用户界面	1	7	1	5			2	
3	网上支付概念	2	10	1	3	1		4	3
4	数据库设计	2	12	1	1	6	3		
5	软件原型	2	8	3, 4	4	3	4		
6	管理工具	2	13	2, 5	1	2	4	3	
7	可用性测试	4	15	5	2	1		2	
8	在线帮助	3	14	5	1		3	2	
9	导入界面	3	5	4	2	5	2		
10	数据导入	1	10	6, 9		3		2	
11	市场营销计划	2	11	1				4	6
12	信息技术开发	3	6	5	3	3	5		
13	设定价格	4	11	11				3	5
14	功能测试	1	5	7, 12, 13	1		3		
15	应用测试	3	3	8, 10, 14	2		1	2	
16	文档	1	22	2	3	1	3	2	
17	启动运行	4	2	15, 16	1		4	3	

资源	时薪	是否有空档/时 间来做这项目	从第。。。周 有时间/可上岗	技能				
				网页设计	数据库	编程	业务	销售+市场营销
Alex	86	100%	4	3	1	2	2	
Anna	160	100%	2	6	5	6	3	
Bill	102	100%	4	3	2	4		2
Cindy	87	80%	3	2	3	3		
Felix	89	100%	6	1		4		1
Fred	89	90%	1	2	4	2		
Hans	135	80%	2	6	3	5	2	
John	125	100%	3	4	6	5		
Livio	97	100%	2	1	1		4	6
Luc	70	70%	3	2		4		
Marco	89	100%	3	1			5	5
Paul	175	100%	4	5	5	6	3	1
Peter	128	80%	2	6	4	4	1	
Sue	151	80%	1	5	3	4	5	3
Ted	58	100%	3	3		3		
Tim	97	100%	1	2		4	3	

任务网络

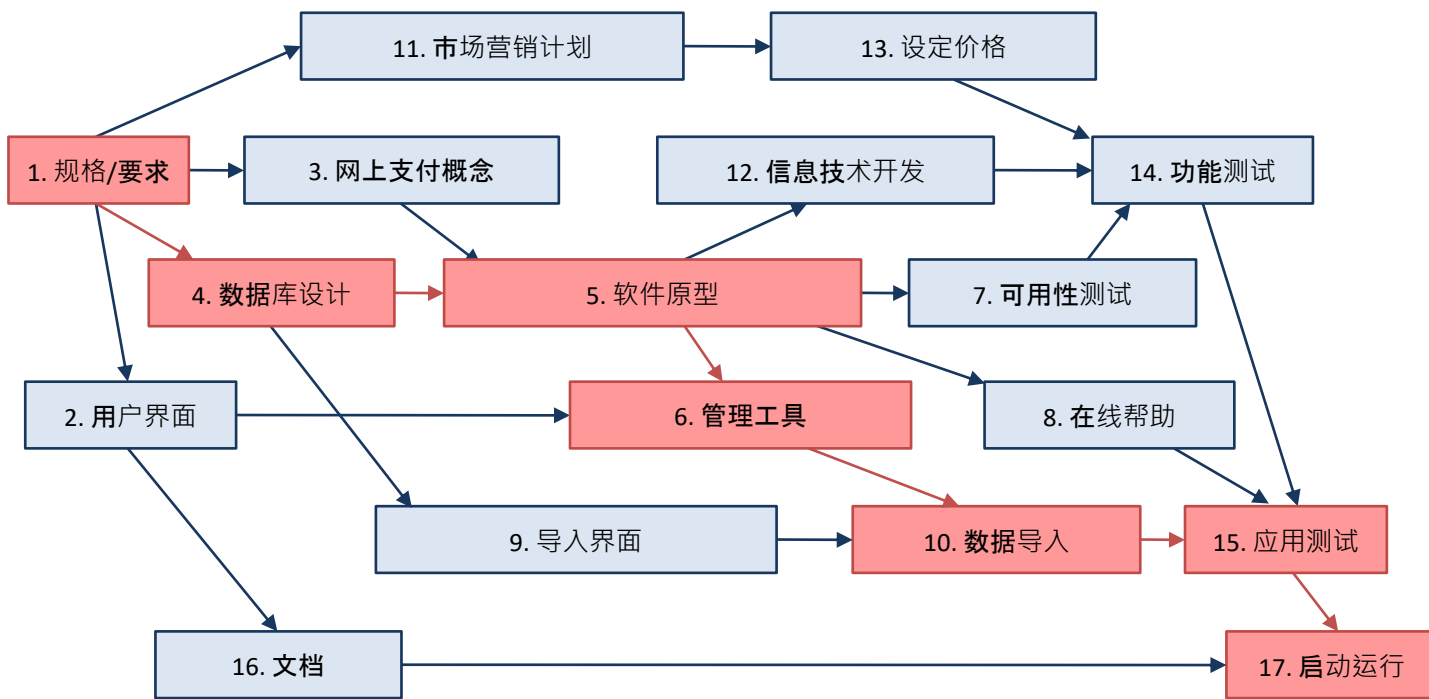

甘特图表

