


Projectbeschrijving

agilehybrid




SimulTrain

Projectbeschrijving

Naam van het project	Online Service deployment
Geschatte duur	11 weken
Mijlpalen	<ol style="list-style-type: none">1. Goedkeuring van de specificaties2. Prototype van de software klaar3. Testen afgerond4. Deployment completed
Team	<ul style="list-style-type: none">– Sue, Fred en Tim– Andere medewerkers volgens behoefte
Omschrijving	In overeenstemming met de nieuwe marketingstrategie wil het management alle klanten voorzien van een interactieve on-line service. Dit geeft klanten de mogelijkheid orders op te volgen zonder interventie van klantenservice of de boekhouding. De vertegenwoordiger is hierbij de produkteigenaar. Het overzicht met produkten voor nalevering en een budget voor de 1e fase zijn reeds gedefiniëerd. Het kernteam is reeds samengesteld.

Organigram

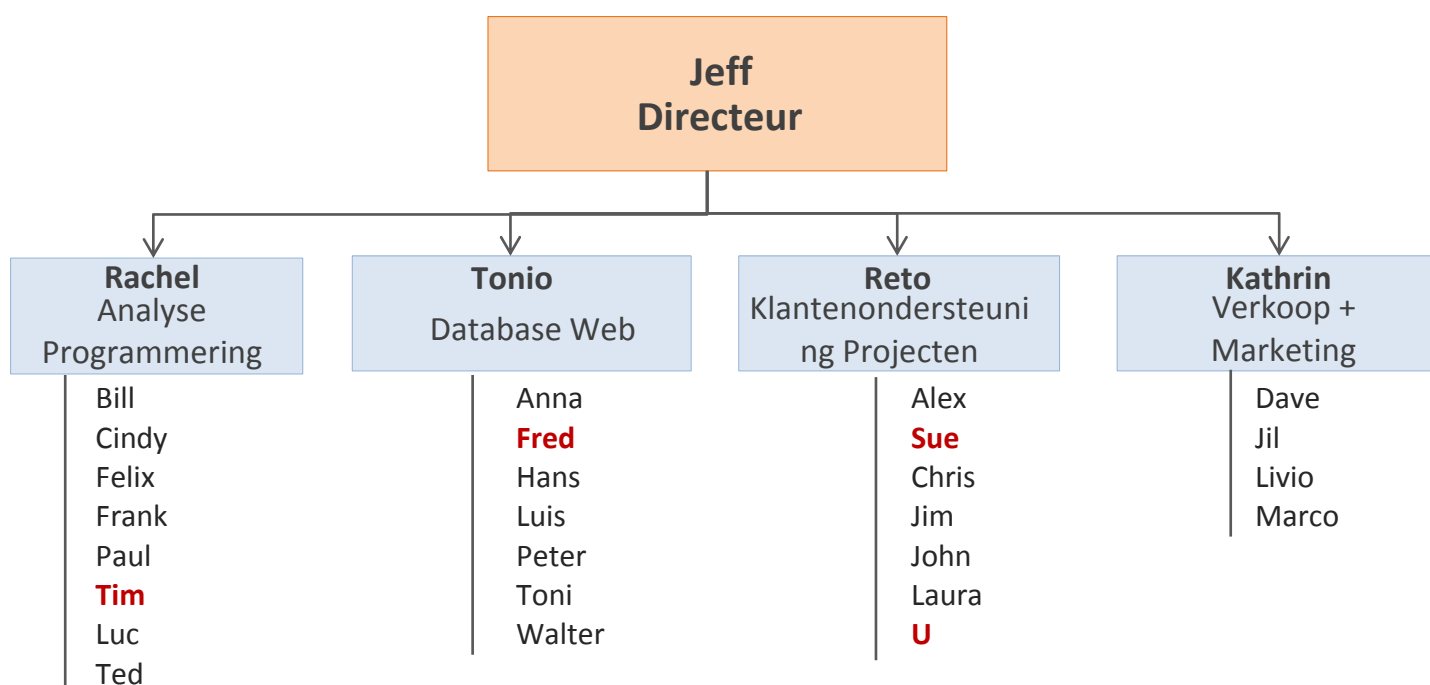

Backlog Items				Vereiste kwalificaties					
				Webdesign	Database	Programmeren	Domein	Verkoop + Marketing	
	Aantal medewerkers	Geschatte duur (dagen)	Hangt van voorgaande activiteiten af						
1	Architectuur van de oplossing	2	5	—	2			5	3
2	Ondersteuningsconcept	1	7	—	5			2	
3	Gebruikersinterface	2	10	—	4	2		3	1
4	Databaseontwikkeling	2	12	1	1	6	3		
5	Alpha vrijgavetest	2	8	4	3	1	2	2	2
6	Artwork ontwerp	2	13	5	5	1	1	3	
7	zoekimplementatie	4	15	—	3	2	3		
8	Traffic Optimalisering	3	14	—	1	2	4		
9	Administratieve tools	3	5	—	5	1	2	1	
10	Kandidaat vrijgeven	1	10	6	3		3	2	
11	Marketing Strategie	2	11	—				4	6
12	eShop ontwerp	3	6	—	3	1	4	2	
13	Marketing campagne	4	11	11				3	5
14	Uitrol eShop	1	5	12	4		1	2	
15	Integratietest	3	3	10	2		1	2	
16	Uitrol ondersteuning	1	22	2	5			2	
17	Algemene beschikbaarheid	4	2	15	3		3	2	

Resourcetabel				Vaardigheden				
				Webdesign	Database	Programmeren	Domein	Verkoop + Marketing
	Uurtarief	Beschikbaarheid voor het project, %	Beschikbaar vanaf week					
Alex	86	100%	4	3	1	2	2	
Anna	160	100%	2	6	5	6	3	
Bill	102	100%	4	3	2	4		2
Cindy	87	80%	3	2	3	3		
Felix	89	100%	6	1		4		1
Fred	89	90%	1	2	4	2		
Hans	135	80%	2	6	3	5	2	
John	125	100%	3	4	6	5		
Livio	97	100%	2	1	1		4	6
Luc	70	70%	3	2		4		
Marco	89	100%	3	1			5	5
Paul	175	100%	4	5	5	6	3	1
Peter	128	80%	2	6	4	4	1	
Sue	151	80%	1	5	3	4	5	3
Ted	58	100%	3	3		3		
Tim	97	100%	1	2		4	3	

Activiteitsnetwerk

